



Konference Odpady 2013 a jak dál ?

24.4.2013

postup projektu 2012-2013



Ing. Petr Mareš

člen představenstva EVO – Komořany, a.s.



S T E O

Lokalita


United Energy, a.s.

EVO Komořany




Základní informace

- ✎ **Zřízení 150 000 t/rok KO, jedna linka**
- ✎ Fond provozní doby: 8 000 h/r
- ✎ Hodinová kapacita kotle: 18,75 t odpadu /h
- ✎ Výhřevnost odpadu: 10 MJ/kg (orientační průměr)
- ✎ Vyrobená pára 56 t/h, 408 °C, 4,2 MPa
- ✎ Výkon kotle : 52 MW_t
- ✎ Výroba EE : 7,6 – 12,7 MW_{el} (46 000 MWh/r)
- ✎ Výroba tepla: 32 MW_t (833 000 GJ/r)

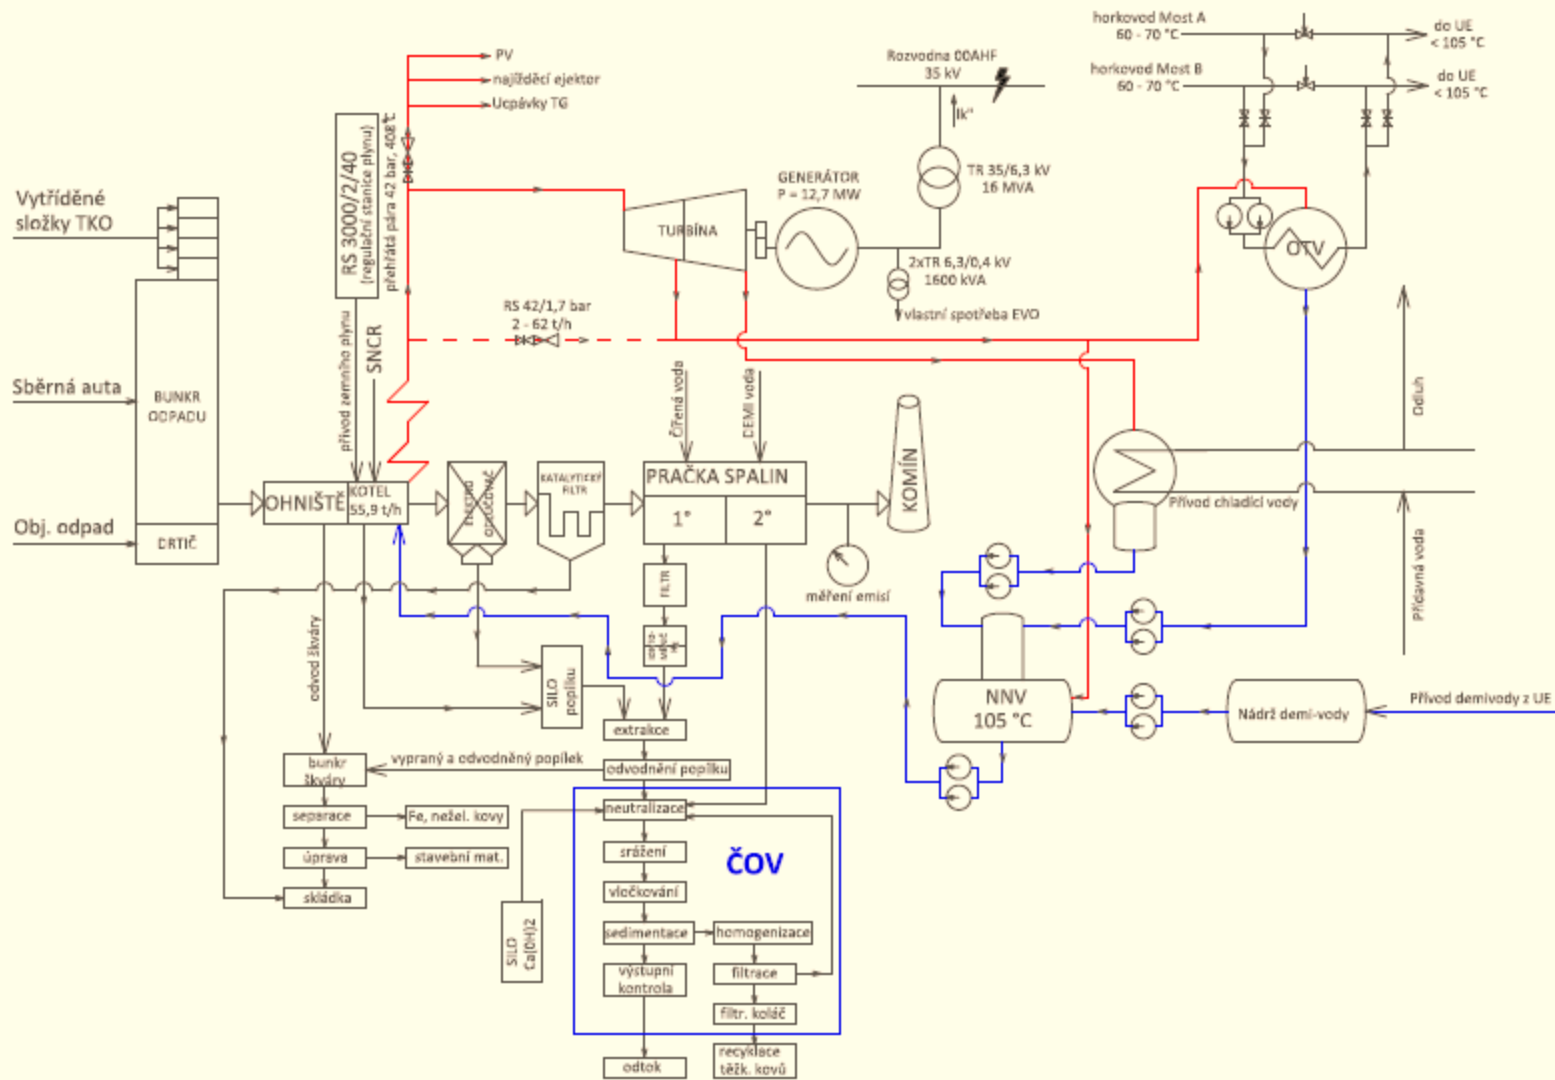

Naše motto stále platí

Máme dobrý projekt na správném místě

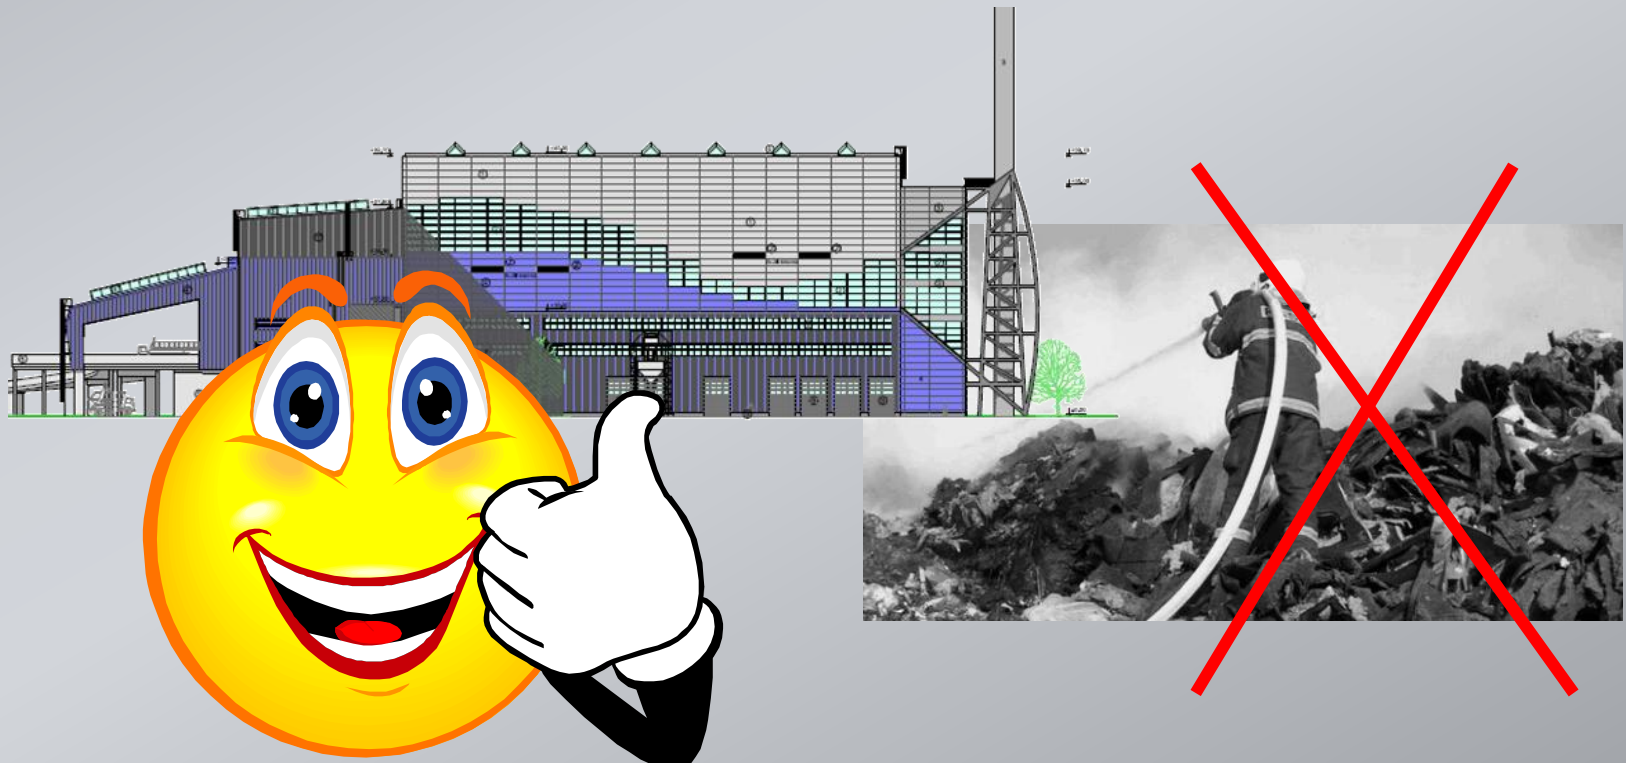

Krátká rekapitulace

Postup v 2008 - 2011

- ∞ Proč EVO v Komořanech? V jaké velikosti?
- ∞ Studie proveditelnosti, EIA, ekonomické analýzy, DÚR
- ∞ Podání žádosti o podporu, začátek jednání s Jaspers, příprava výběrového řízení, územní řízení

Aktuální stav projektu

- ∞ Platné územní rozhodnutí
- ∞ Platné integrované povolení (IPPC)
- ∞ JASPERS Action Completion Note (!)
- ∞ Platné vodoprávní stavební povolení
- ∞ Zahájené stavební řízení
- ∞ Ve VŘ kvalitní nabídky od předních světových výrobců VŘ

Projekt je připraven k realizaci, ale...!!!

Zkušenosti

- ∞ -Změna výše dotace v průběhu přípravy 40 % → 23 %
- ∞ -Brusel mění další pravidla hry za pochodu – požadavek na stavební povolení k žádosti, BAT+ ... vliv na termín dokončení projektu
- ∞ -EK zpochybňuje povolovací proces (EIA) v ČR
- ∞ -Odklad reformy nakládání s odpady - nedostatečná podpora využívání odpadů na krajských a nižších úrovních (POH x Evropské směrnice) – vysoké riziko pro investory
- ∞ -Žaloby proti KÚ Ústeckého kraje za Územní rozhodnutí

**Přesto příprava projektu
stále pokračuje!**



Zkušenosti

- ☞ +JASPERS – významný pomocník
- ☞ -Zákon o zadávání zakázek
- ☞ -Komplikovaný a dlouhý povolovací proces -vypořádání „veřejných“ připomínek – riziko termínu dokončení
- ☞ -Zdroj paliva – nezáměr o nabídnuté řešení (pozitivní rétorika ve smyslu podpory projektu není atraktivní téma...je dokonce „nebezpečná“)
- ☞ -Zdroj paliva – racionální/iracionální přístup měst/občanů/voličů – „spalovny ano, pokud budou levnější nežspalovny ne, protože máme skládku a příjem z uložené tuny.
- ☞ -Příliš komplikovaná komunikace pracovní osa: ...Projekt – SFŽP – MŽP – Brusel a zpět
- ☞ -Sterilní přístup legislativní moci k projektům EVO v ČR (ovlivněna negativně ekonomika/udržitelnost projektu)

Zkušenosti –výběr zhotovitele

- ⌘ nadlimitní veř. zakázka -jednací řízení s uveřejněním
- ⌘ 6 kvalifikovaných zájemců 9-11/2011
- ⌘ Tři nabídky 5/2012
- ⌘ čtyři jednací kola
- ⌘ 80 dotazů a odpovědí
- ⌘ předepsaná váha kritérií hodnocení (80%cena)
- ⌘ Závěr - vyhodnocení VŘ 4/2013

Dotazy?

EVO - Komořany, a.s., Teplárenská 2

434 03 Most-Komořany

tel.: + 420 476 447 191

email: petr.mares@ue.cz

www.evokomorany.cz

